【붙임 1】 1·2단계 심사자료 제출 양식

양동시장역 외부 엘리베이터 설치			
사업분야	시민체감		
경영평가 연계지표	지역·상생·협력		
담당부서	토목궤도팀	담당자	임근태(☎8241)
가점항목	☑ 해당 ☐ 해당없음 (해당시 체크 ☑ 보도자료 ☐ 대외수상)		

□ 추진개요

○ 추진배경

- 1호선 중 유일하게 양동시장역만 지상 엘리베이터가 없어 장애인, 노약자의 이동불편과 민원이 잦아 기존 에스컬레이터를 철거하고 엘리베이터 신설
  - · 장애인 단체의 반복된 시위 및 이용객의 민원 등 지속적인 개선 요구
  - · 개통 후 20년간 지상 엘리베이터 부재로 교통역자 수직이동 불편
  - · 기존 에스컬레이터 및 휠체어 리프트 이용 시 전도사고 등 시민안전 위험요소 상존

○ 사업개요

- 위　　치 : 광주도시철도 1호선 양동시장역 1번 출입구
- 사업기간 : 2025. 11. 28. ~ 2026. 05.26.
- 규　　모 : 지상 엘리베이터 15인승 1대(지상 ↔ 지하 1층)
- 사 업 비 : 728백만원

□ 추진실적

○ 양동3구역 재개발사업과 연계한 엘리베이터 설치 노력 : '17~25년

○ 양동시장역 엘리베이터 설치 검토(안) : '25. 1월

- 1번 출입구 에스컬레이터 철거 후 엘리베이터 설치

○ 양동시장역 외부 엘리베이터 설치공사 설계 착수 : '25. 3월

○ 양동시장역 외부 엘리베이터 설치사업 市 교부금 교부 : '25. 7월

○ 양동시장역 외부 엘리베이터 설치공사 시행 : ’25.11월

○ 민원 최소화를 위해 공사기간 중 전동차 안내방송 및 역사 환기 실시 : ’ 26. 1~ 6월

○ 시장 민원인 요구로 추가 공사 실시 : ’26. 6월

○ 양동시장역 외부 엘리베이터 설치공사 준공 및 개통 : ’26. 6월

□ 주요성과

○ 광주도시철도 1호선 “전 역사 1동선” 확보와 장애인 등 교통약자 이동권 증진

○ 편의시설 개선으로 승객수 및 교통약자 5~6% 증가

구 분	’25년 6월(명)	’26년 6월(명)	변화량(명)
승 객 수	65,424	69,419	총 3,995(6.1%) ↑
교통역자	34,171	35,904	총 1,733(5.1%) ↑

○ 양동시장 지역상권 활성화 노력에 대한 감사의 표시로 양동시장 상인회에서 감사패 증정

※ 증빙자료 첨부

시민의 행복을 나르는 참조적인 안전 도시철도

광주광역시도시철도공사

수신자 광주광역시서구청장(도시재생과장)
(경유)

제목 양동3 주택재개발 정비사업 사업시행인가 신청에 따른 의견 회신

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원하며, 도시재생과-13406호(2017.10.10)와 관련입니다.
2. 위호의 「서구 양동3 주택재개발 정비사업」의 사업시행인가 신청과 관련한 검토의견을 붙임과 같이 회신합니다.

붙임 검토의견. 끝.

광주광역시도시철도공사사장

전결 1027
처 장 김태삼 토목팀장 이상래

협조자

시행 토목팀-137 (2017.10.27.) 접수

주 61999 광주광역시 서구 양무대로 160 /
전화 062)604-6041 전송 062)604-6029 / ts2869@gtc.co.kr / 공개


투명한 세상을 여는 클린(Clean) 도시철도

양동3 주택재개발 정비사업 시행인가 신청에 따른 의견 회신1(토목팀-137, 2017.1027)

○ 검토의견

구 분	검토의견
지하철 인접공사에 따른 제반사항 검토	- 「철도안전법시행령」 제46조 제4항에 따른 「철도보호지구에서의 행위제한에 관한 업무지침」에 의거하여 해당 사업지가 도시철도 경계로부터 30m이내에 해당하는 협의대상으로 향후 사업시행 시 도시철도시설물의 안전을 고려하여 협의 후 시공될 수 있도록 협조 바람.
협조요청사항	- **도시철도 양동시장역 지상엘리베이터(지상 ↔ 지하1층 대합실) 설치 추진 관련 협조요청** · 양동시장역 출입구(3,4번) 주변 보도가 협소하여 엘리베이터 설치가 어려운 실정으로 양동3 주택재개발 정비사업 추진 시 부지내 후퇴된 보도에 시민편의를 위한 엘리베이터를 설치 계획으로 이에 협조 바람.

※ 양동시장역 엘리베이터 설치예정 위치도

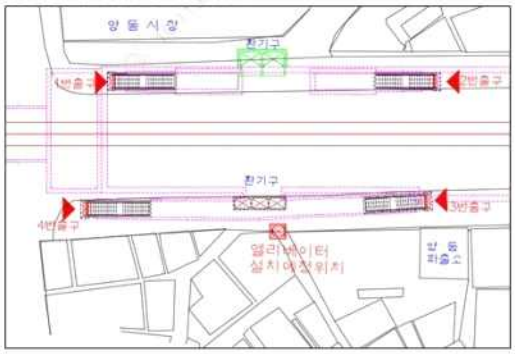

양동3 주택재게발 정비사업 시행인가 신청에 따른 의견 회신2 (토목팀-137, 2017.1027)

문서번호	건축팀-99
보존기간	5년
보고일자	2025.01.06

건축팀장	기술운영처장	기술본부장	사장
정기환	문희주	이상용	초안

협조 [illegible]

영업행정 사전검토 : 부서 단독

-1역사 1동선 100% 달성을 위한

양동시장역 엘리베이터 설치 검토계획(안)

광주교통공사
[기술운영처 건축팀]

양동시장역 엘리베이터 설치 검토(안)1 (건축팀-99, 2025.01.06.)

1역사 1동선 100% 달성을 위한

양동시장역 엘리베이터 설치 검토계획(안)

도시철도 1역사 1동선 확보*에 대한 사회적 요구가 증가함에 따라 1호선 역사 중 지상엘리베이터가 설치되어 있지 않은 양동시장역에 엘리베이터를 설치코자 기존 양동3구역 재개발 사업과 연계(사업지연)한 공간확보 계획을 원점에서부터 재검토하여 설치위치 변경을 통한 조속한 추진방안을 마련코자 함.

* 1역사 1동선은 교통약자가 지하철을 이용하기 위해 지상(또는에서 승강장까지 이동할 때 다른 사람의 도움 없이 엘리베이터로 이동할 수 있는 동선

I 추진개요

□ 추진배경

○ 전국 도시철도 중 1역사 1동선 미확보한 운영기관(서울, 광주)으로 지속적인 민원 우려 *서울교통사는 25년까지 1역사 1동선 확보계획

○ 3, 4번 출입구 방면 주택재개발 사업 지연으로 엘리베이터 조속한 설치 어려움

○ 1, 2번 출입구 에스컬레이터가 설치된 지 16년 경과로 노후화되었고, 에스컬레이터 탑승 중 승객전도 등 잦은 안전사고 발생

*지상엘리베이터 대체로 3번 출입구에 휠체어리프트가 1대(300kg, 2011년) 설치되어 있으나, 내용연수 초과(8년) 및 부품 단종으로 유지관리 애로

○ 양동시장 상인회, 노약자 등 이용자가 양동시장 방면(1, 2번 출입구)으로 엘리베이터 설치요구


□ 그간 추진경과

○ ('04개통시) 양동시장역 지상엘리베이터 미설치

- 신설당시(2004년) 지상부 보도폭 협소, 사유지 저촉, 지하매설 지장물 등으로 엘리베이터 설치불가 ⇒ 휠체어리프트 대체설치

양동시장역 엘리베이터 설치 검토(안)2 (건축팀-99, 2025.01.06.)

【수직형 엘리베이터 설치도】

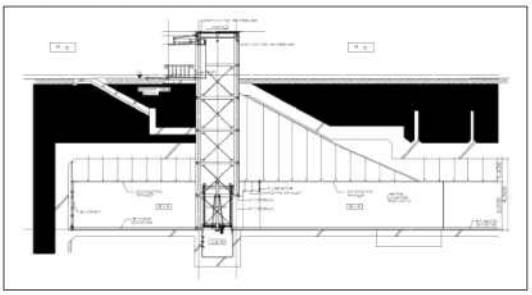

□ 검토의견

○ 경사형 엘리베이터 관련 서울교통공사 출장(12.09) 및 관련 부서(기계환경팀, 토목팀) 기술적 의견을 종합한 결과, 정책적 결정을 통해 1번 출입구(에스컬레이터)를 매몰하고 설치기간 단축, 사업비 절감에 유리한 **수직형 엘리베이터를 설치**하는 것을 건의

○ 따라서, 1번 출입구 폐쇄 시 관련 규정에 따른 대피시간의 적정 여부를 판단할 수 있는 **피난 시뮬레이션 용역을 최우선적으로 추진**하여 엘리베이터 설치 가능여부를 판단, 추진코자 함

Ⅲ 향후 추진계획

□ 사업추진 정책 결정

○ 양동시장역 피난 시뮬레이션 용역 시행

- 추진시기 : '25.1 ~ 2.

양동시장역 엘리베이터 설치 검토(안)3 (건축팀-99, 2025.01.06.)

문서번호	토목궤도팀-2670
보존기간	5년
보고일자	2025.03.21

차 장	토목궤도팀장	기술운영처장
임종학	김태성	문형주

협조: 건축팀장 정기원 자산회계팀장 오정록 안전감사 임경자
기계환경팀장 안동준 성과혁신팀장 이한석

절대안전과 혁신으로
내일이 빛나는 광주교통공사

양동시장역 지상 엘리베이터 설치공사 설계용역 계획(안)

광주교통공사
[기술운영처 토목궤도팀]

양동시장역 지상 엘리베이터 설치공사 설계용역 계획(안) 1 : 토목궤도팀-2670, 2025.03.21.

- 양동시장역 지상 엘리베이터 설치공사 -

설계용역 계획(안)

교통약자 이동편의 증진 및 지하철 이용객의 불편 해소를 위해 양동시장역 지상엘리베이터 설치를 위한 설계용역을 시행코자함.

Ⅰ 추진근거

○ 양동시장역 지상 엘리베이터 설치공사 계획(안) - 건축팀-1426('25.3.17.)

Ⅱ 용역개요

○ 용 역 명 : 양동시장역 지상 엘리베이터 설치공사 설계용역
○ 위 치 : 광주도시철도 1호선 양동시장역 1번 출입구
○ 규 모 : 지상 엘리베이터 15인승 1대(지상 ↔ 지하 1층)
○ 용 역 비 : 48,432천원
○ 용역기간 : 착수일로부터 120일
○ 용역내용
- 엘리베이터 설치에 따른 시설물 검토 및 설계도서 작성(토목, 건축·기계분야)

Ⅲ 그동안 추진사항

○ 양동시장 상인회, 노약자 등 이용자가 양동시장 방면(1, 2번 출입구)으로 엘리베이터 설치요구

○ 양동시장역 지상 엘리베이터 설치공사 계획 사장님 방침 결재 : '25. 3. 17.

○ 일상감사(기술감사팀-947, 2025.03.20.) : 적정(의견없음)

양동시장역 지상 엘리베이터 설치공사 설계용역 계획(안) 2 : 토목궤도팀-2670, 2025.03.21.

○ 설계용역비 산출을 위한 분야별 소요사업비 산정('25.3.17.)

단위(백만원)

분 야	사업비	사업내용
토목	334	기존구조물 철거, 구조보강
건축	188	엘리베이터(E/L)박스, 실내마감
기계	186	기존 에스컬레이터 철거, E/L설치 기계공사
계	708	

Ⅳ 집행계획

○ 예산검토

단위(천원)

구 분	예산액	기집행액	금회집행액	잔 액	비고
터널물청소 용역	149,562	-	48,432	101,130	

※ 예산과목 : 분야)사업비용 정책)대중교통시비스 구축 및 운영
단위 · 세부)1호선 관리 목)일반운영비 세목)재규수수료(일반)
※ 배정된 재규수수료(터널물청소 용역) 추진 사항 후 추경예산 확보

○ 입찰방식 및 참가자격

구 분	양동시장역 지상 엘리베이터 설치공사 설계용역
입찰방식	제한경쟁입찰(업종제한, 지역제한)
입찰 참가자격	- 토목분야 : 엔지니어링사업과 건설기술용역업으로 등록 - 건축 및 기계분야 : 건축사사무소로 등록 - 공고일 전일 현재 광주광역시 및 전라남도에 주된 영업소를 두고 영업행위를 하는 업체

Ⅴ 향후 계획

○ 용역발주 의뢰 및 용역 착수 : '25. 3월중
○ 용역 시행 : '25. 4월 - 8월
○ 공사발주 의뢰 및 공사 착수 : '25. 9월중
○ 공사 시행 : '25. 10월 - '26. 4월

양동시장역 지상 엘리베이터 설치공사 설계용역 계획(안) 3 : 토목궤도팀-2670, 2025.03.21.

붙임 1. 과업내용서
2. 설계내역서
3. 용역설계설명서
4. 용역조서
5. 일상감사 [양동시장역 지상 엘리베이터 설치공사 설계용역] 의견회신
6. 양동시장역 지상 엘리베이터 설치 추진 알림
7. 양동시장역 지상 엘리베이터 설치 계획(안).hwp
8. 설치위치 및 내부 설치도
9. 양동시장역 지상엘리베이터 설치공사_개략내역서. 끝.

양동시장역 지상 엘리베이터 설치공사 설계용역 계획(안) 4 : 토목궤도팀-2670, 2025.03.21.

2025 세계양궁선수권대회 · 세계장애인양궁선수권대회, 9월 광주에서 만나요!

광 주 광 역 시

수신자 광주교통공사사장
(경유)

제목 양동시장역 외부 엘리베이터 설치 사업 교부금 교부

1. 광주교통공사 토목궤도팀-6655(2025.7.11.)호와 관련입니다.

2. 「광주광역시 지방보조금 관리 조례」 제9조(교부결정)에 따라 '양동시장역 외부 엘리베이터 설치 사업' 보조금을 다음과 같이 교부결정 통지하니 관련규정을 준수하여 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 사 업 명 : 양동시장역 외부 엘리베이터 설치 사업
○ 보조사업자 : 광주교통공사(대표 조익문)
○ 교부결정액 : 금750,000,000원(금칠억오천만원) - 전액 시비
○ 교부내역

(단위:천원)

보조대상액 (A)	교부액			교부액 재원구분			자체부담
	기교부액 (B)	금회교부액 (C)	교부잔액 A-(B+C)	계	국비	시비	
750,000	0	750,000	0	750,000	0	750,000	0

○ 예산과목 : 세부)광주교통공사사업지원, 편성목)공사공단자본전출금,
통계목)공사·공단자본전출금

붙임 1. 지방보조금 교부결정서 및 교부조건 1부.
2. 지방보조사업 실적보고 및 정산서(서식) 1부.
3. 사업비 통장 사본 1부. 끝.

광 주 광 역 시 장

양동시장역 외부 엘리베이터 설치 사업 교부금 교부 1 : 광역교통과-7663, 2025.07.23.

주무관 박희순 | 광주교통과장 오윤정 | 광역교통과장 김종호 | 교통융합교통국장 김영선 (전결 07.23)

협조자 예산담당관 김선자

시행 광역교통과-7663 (2025.07.23.) 접수 토목궤도팀-7062 (2025.07.23)
우 61945 광주광역시 서구 내방로 111, (치평동) / limorange14@korea.kr
전화 062-613-4031 전송 062-613-4499 / limorange14@korea.kr / 비공개(6)
청렴은 당신과 나의 아름다운 약속

양동시장역 외부 엘리베이터 설치 사업 교부금 교부 2 : 市 광역교통과-7663, 2025.07.23.

문서번호	토목궤도팀-10340
보존기간	5년
보고일자	2025.11.03

토목궤도팀장	기술운영처장	기술본부장	사장
강대성	문혜주	이상용	조익문

협조					
	차 장	오동찬	영무운영팀장	노인배	경영본부장 김준수
	기계환경팀장	양동운	영업계획팀장	송선화	청렴감사 양문카
	전기팀장	유병권	자산회계팀장	오병록	
	차 장	민경덕	설계품질팀장	이한숙	

협업행정 사전진단 : 협업과제

양동시장역 외부 엘리베이터 설치공사 시행계획(안)

광주교통공사
(기술운영처 토목궤도팀)

양동시장역 외부 E/V 설치공사 시행계획(안) 1 : 토목궤도팀-10340, 2025.11.03.

- 양동시장역 외부 엘리베이터 -

설치공사 시행 계획(안)

교통약자 이동 편의 증진 및 지하철 이용객의 불편 해소를 위해 양동시장역 외부 엘리베이터 설치공사 시행 계획을 보고 드림

Ⅰ 관련근거

○ 양동시장역 지상 엘리베이터 설치공사 계획(안) - 건축팀-1426('25.3.17.)

Ⅱ 사업개요

○ 위　　치 : 광주도시철도 1호선 양동시장역 1번 출입구
○ 규　　모 : 외부 엘리베이터 15인승 1대(지상 ↔ 지하 1층)
○ 사 업 비 : 750백만원

※ 예산과목 : (1) 자본적지출 항) 유형자산취득 세항) 냉도설비 목) 시설비 및 부대비

Ⅲ 그동안 추진사항

○ 양동시장 상인회, 노약자 등 이용자가 양동시장 방면(1, 2번 출입구)으로 엘리베이터 설치요구
○ 市 보조금 교부(7.5억, 광주광역시 광역교통과 - 7663, '25. 7. 23.)
○ 설계 용역
  - 용 역 비 : 43,610천원(토목, 건축, 기계 분야 – 전기 통신 자체 설계)
  - 설계내용 : 토목 · 건축공사, 에스컬레이터 철거, 엘리베이터 설치, 폐기물 처리 등
○ 서구청 디자인 심의 : 대상 아님(에레이드로 인해 지상노출 엘리베이터 아님)
○ 市 계약심사(市 감사위원회-11817, '25. 10. 23.)
  - 심사내용 : 인위대가, 수량 및 내역 조정
  - 총공사비 : 482.882천원(토목, 건축, E/S철거)

양동시장역 외부 E/V 설치공사 시행계획(안) 2 : 토목궤도팀-10340, 2025.11.03.

○ 일상감사(기술감사팀-3598, '25. 10. 30.)
  - 심사내용 : 원가계산시 공사이행보증수수료 삭제
  - 총공사비 : 482.793천원(토목, 건축, E/S철거)

Ⅲ 공사 추진 계획

○ 엘리베이터 설치 공사 발주
  - 공 사 비 : 482,793천원
  - 공사대상 : 토목, 건축, E/S 철거
  - 공사기간 : 착공일로부터 180일
  - 분야별 세부 공사 계획
    · 기계분야 : 엘리베이터 설치 별도 발주
    · 전기 · 통신 · 기계(소방,공조)분야 : 토목, 건축공사 진행에 따라 별도 발주
    · 폐기물처리 : 별도 발주

Ⅳ 계약심사 및 일상감사 결과

○ 조정금액 : 감 9,297천원
  - 市 계약심사 : 감 9,226천원

단위(천원)

당 초	변 경	증감액	사 유
492,108	482,882	감 9,226	일위대가, 수량 및 내역 조정

  - 감사실 일상감사 : 감 71천원

단위(천원)

당 초	변 경	증감액	사 유
482,882	482,793	감 71	공사이행보증수수료 삭제

양동시장역 외부 E/V 설치공사 시행계획(안) 3 : 토목궤도팀-10340, 2025.11.03.

Ⅴ 집행계획

○ 예산집행

단위(천원)

구 분	예산액	기집행액	금회집행액	잔 액	비고
양동시장역 외부 엘리베이터 설치공사	750,000	34,000	482,793	233,207	

※ 분야별 공사비

단위(천원)

총 공사비	토목건축E/S철거	기계	전기	통신	임대차 보상	폐기물 처리
688,996	482,793	106,221	33,700	22,154	34,000	10,128

※ 예산과목 : (1) 자본적지출 항) 유형자산취득 세항) 냉도설비 목) 시설비 및 부대비

○ 입찰방식 및 참가자격

구 분	양동시장역 외부 엘리베이터 설치공사
입찰방식	제한경쟁입찰(업종제한, 지역제한)
입찰 참가자격	– 건설산업기본법 제9조의 규정에 의한 토목건축공사업으로 등록한 업체 – 건설산업기본법 제9조의 규정에 의한 토목공사업과 건축공사업으로 등록한 업체 – 공고일 전일 현재 주된 영업소의 소재지가 광주광역시인 업체


Ⅵ 향후 계획

○ 공사발주 의뢰 : '25. 11. 5.
○ 공사계약 : '25. 11월말
○ 착공식 : '25. 11월말
○ 공사시행 : '25. 11. – '26. 5월.

양동시장역 외부 E/V 설치공사 시행계획(안) 4 : 토목궤도팀-10340, 2025.11.03.

붙임 1. 양동시장역 지상 엘리베이터 설치 계획(안).hwp
2. 공사조서
3. 공사설명서
4. 공사시방서
5. 양동시장역 지상(외부) 엘리베이터 설치공사 설계내역서(건축, 토목,ES철거)
6. 계약심사 결과 통보[양동시장역 지상(외부) 엘리베이터 설치공사]
7. 심사주요내용(양동시장역 엘리베이터).hwp
8. 심사결과요약서(양동시장역 엘리베이터).xlsx
9. [본문] 계약심사 결과 통보[양동시장역 지상(외부) 엘리베이터 설치공사]
10. 일상감사 [양동시장역 외부 엘리베이터 설치공사] 의견회신. 끝.

양동시장역 외부 E/V 설치공사 시행계획(안) 5 : 토목궤도팀-10340, 2025.11.03.

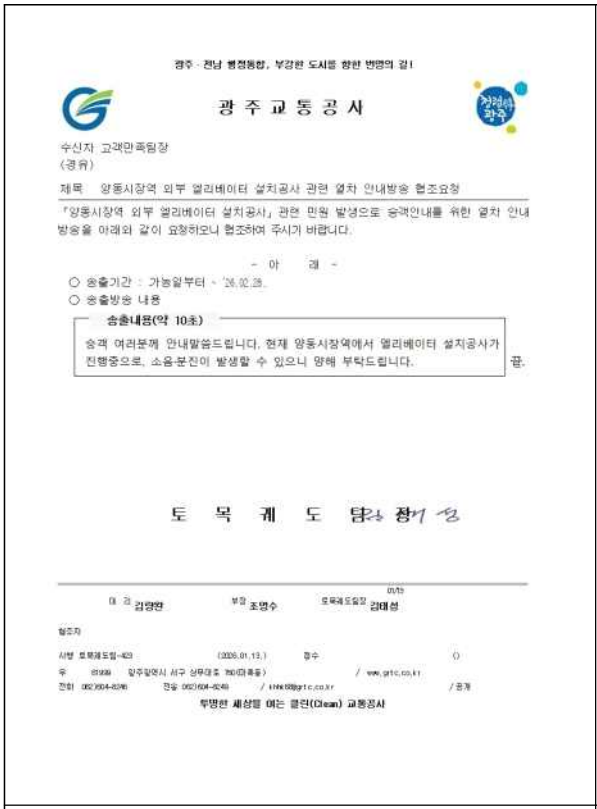

광주 · 전남 행정통합, 부강한 도시를 향한 변명의 길!

광 주 교 통 공 사

수신자 고객만족팀장
(경유)

제목 양동시장역 외부 엘리베이터 설치공사 관련 열차 안내방송 협조요청

「양동시장역 외부 엘리베이터 설치공사」 관련 민원 발생으로 승객안내를 위한 열차 안내방송을 아래와 같이 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

○ 송출기간 : 가능일부터 ~ '26.02.28.
○ 송출방송 내용

송출내용(약 10초)

승객 여러분께 안내말씀드립니다. 현재 양동시장역에서 엘리베이터 설치공사가 진행중으로, 소음·분진이 발생할 수 있으니 양해 부탁드립니다.

끝.

토 목 궤 도 팀장 장기영

0l/l3

대 리 김양환 부장 조명수 토목궤도팀장 김태섭

협조자

시행 토목궤도팀-423 (2026.01.13.) 접수 ()

주 61988 광주광역시 서구 상무대로 780(화정동) / www.gtc.co.kr

전화 062)604-8098 전송 062)604-8049 / kmk98@gtc.co.kr / 공개

투명한 세상을 여는 클린(Clean) 교통공사

양동시장역 외부 E/V 설치공사 관련 열차 안내방송
: 토목궤도팀-423, 2026.01.13.



문서번호	토목궤도팀-5369
보존기간	5년
보고일자	2026.06.04


보 좌	토목궤도팀장	
임근태	김태섭	
협조		

- 양동시장역 외부 엘리베이터 설치공사 -

민 원 사 항 검 토 보 고

광주교통공사
[기술운영처 토목궤도팀]

양동시장역 외부 E/V 설치공사 민원사항 검토보고 1
: 토목궤도팀-5369, 2026.06.04.

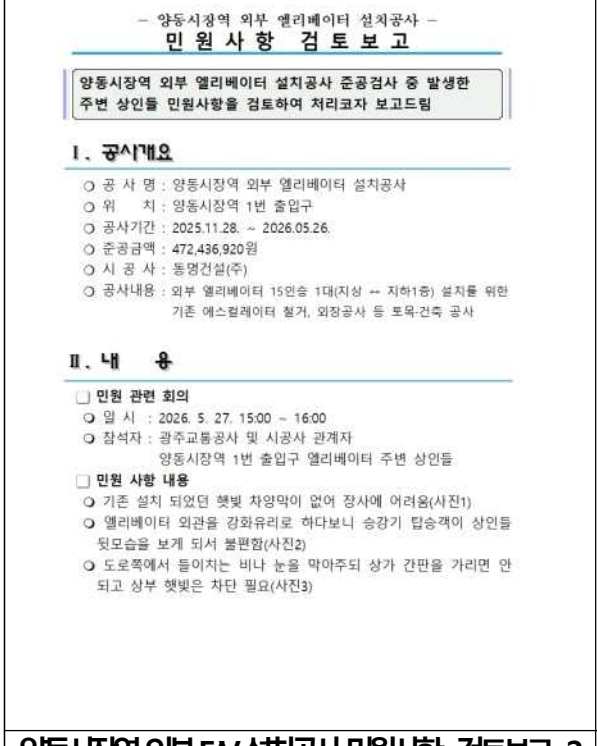

- 양동시장역 외부 엘리베이터 설치공사 -

민 원 사 항 검 토 보 고

양동시장역 외부 엘리베이터 설치공사 준공검사 중 발생한 주변 상인들 민원사항을 검토하여 처리코자 보고드림

Ⅰ. 공사개요


○ 공 사 명 : 양동시장역 외부 엘리베이터 설치공사
○ 위 치 : 양동시장역 1번 출입구
○ 공사기간 : 2025.11.28. ~ 2026.05.26.
○ 준공금액 : 472,436,920원
○ 시 공 사 : 동명건설(주)
○ 공사내용 : 외부 엘리베이터 15인승 1대(지상 ↔ 지하1층) 설치를 위한 기존 에스컬레이터 철거, 외장공사 등 토목·건축 공사

Ⅱ. 내 용

□ **민원 관련 회의**
○ 일 시 : 2026. 5. 27. 15:00 ~ 16:00
○ 참석자 : 광주교통공사 및 시공사 관계자
양동시장역 1번 출입구 엘리베이터 주변 상인들

□ **민원 사항 내용**
○ 기존 설치 되었던 햇빛 차양막이 없어 장사에 어려움(사진1)
○ 엘리베이터 외관을 강화유리로 하다보니 승강기 탑승객이 상인들 뒷모습을 보게 되서 불편함(사진2)
○ 도로쪽에서 들이치는 비나 눈을 막아주되 상가 간판을 가리면 안되고 상부 햇빛은 차단 필요(사진3)

양동시장역 외부 E/V 설치공사 민원사항 검토보고 2
: 토목궤도팀-5369, 2026.06.04.

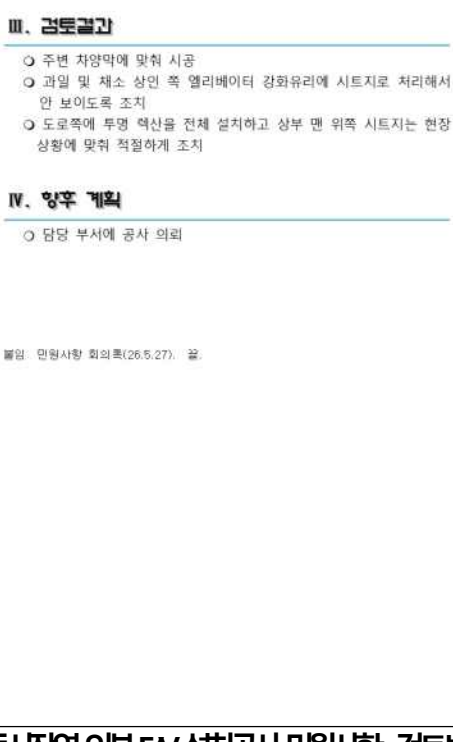

Ⅲ. 검토결과


○ 주변 차양막에 맞춰 시공
○ 과일 및 채소 상인 쪽 엘리베이터 강화유리에 시트지로 처리해서 안 보이도록 조치
○ 도로쪽에 투명 덕산을 전체 설치하고 상부 맨 위쪽 시트지는 현장 상황에 맞춰 적절하게 조치

Ⅳ. 향후 계획

○ 담당 부서에 공사 의뢰

붙임 민원사항 회의록(26.5.27). 끝.

양동시장역 외부 E/V 설치공사 민원사항 검토보고 3
: 토목궤도팀-5369, 2026.06.04.

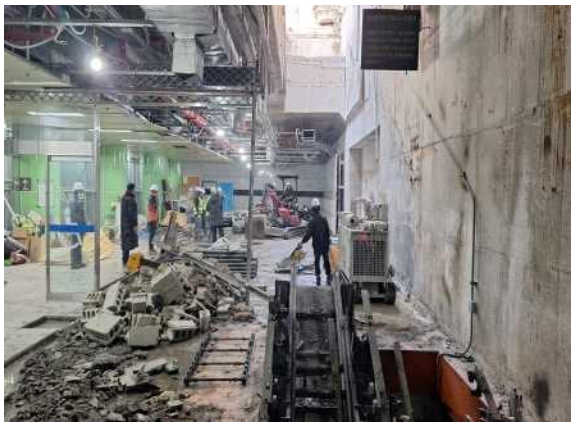	
양동시장역 외부 엘리베이터(공사전-지상)	양동시장역 외부 엘리베이터(공사전-지하1층)
	
양동시장역 외부 엘리베이터(공사중-지상)	양동시장역 외부 엘리베이터(공사중-지하1층)
	
양동시장역 외부 엘리베이터(공사후-지상)	양동시장역 외부 엘리베이터(공사후-지하1층)



언론보도 – 드림투데이(2026.05.27.)



언론보도 – 전남일보(2026.05.31.)



언론보도 – 광남일보(2026.06.15.)



언론보도 – 남도일보(2026.06.16.)
